


● verzamelplaats voor ofwel 100 inwoners in de werfzone

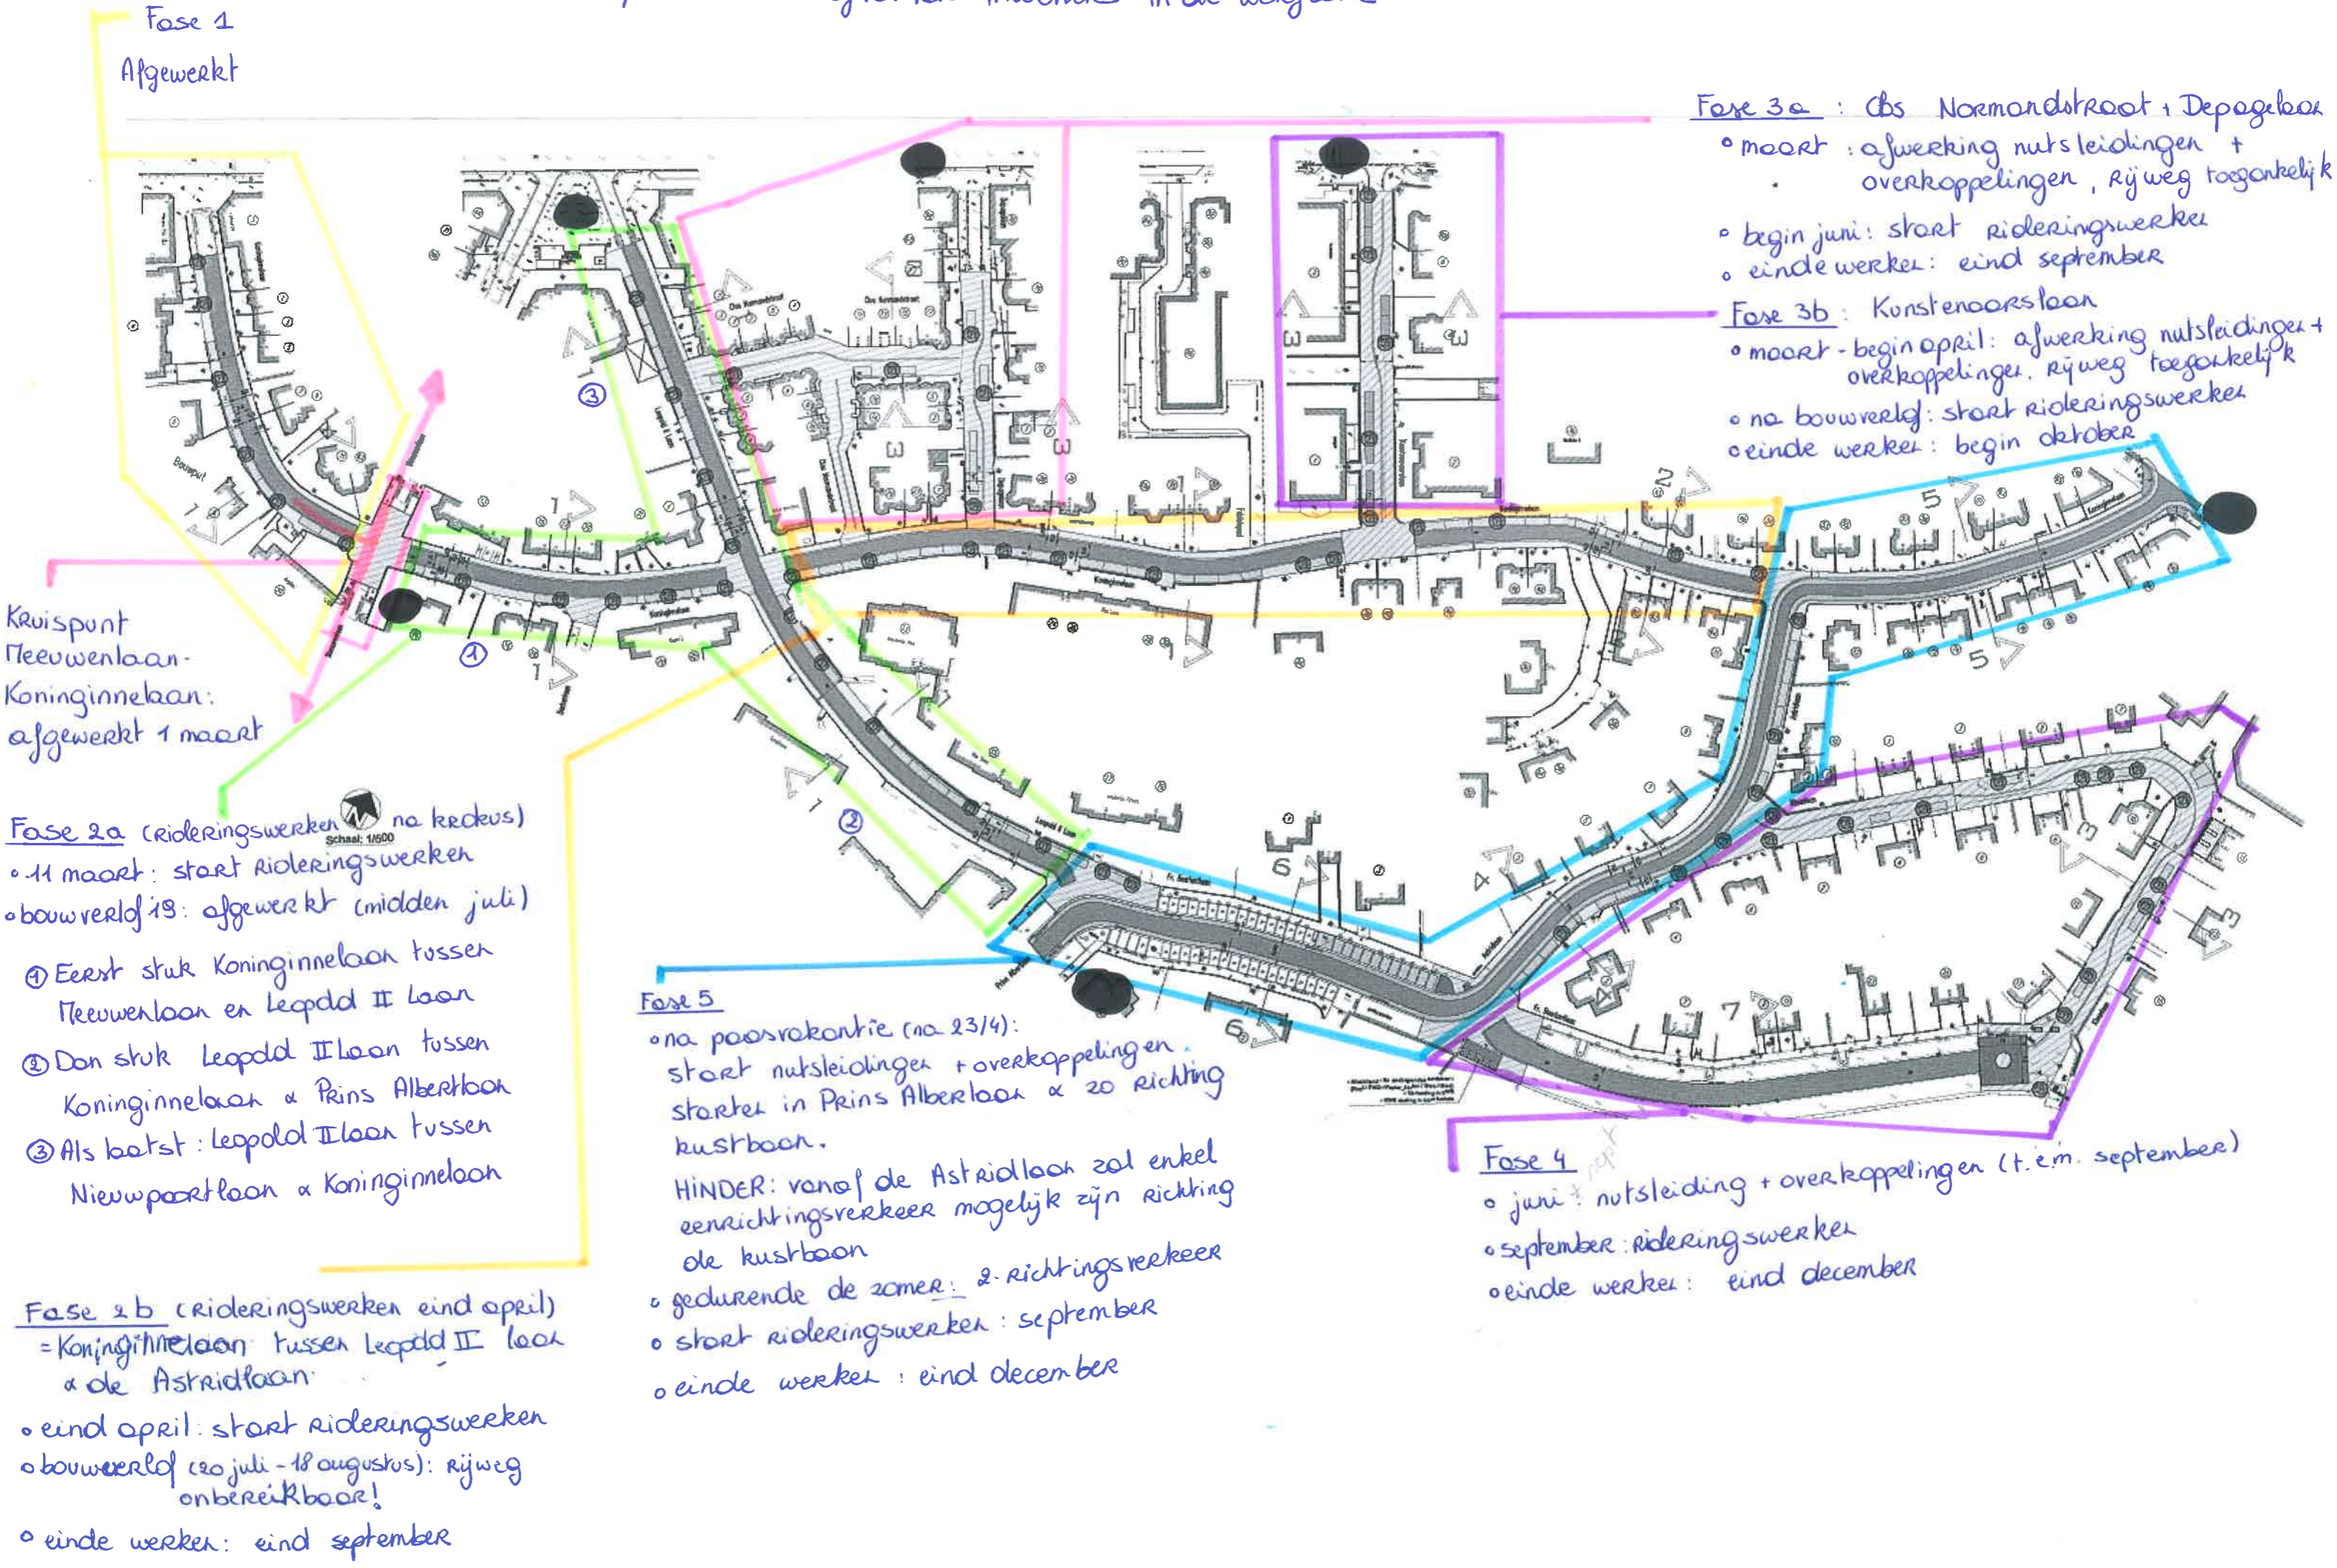

Fase 1
Afgewerkt

Kruispunt
Nieuwenlaan-
Koninginnelaan:
afgewerkt 1 maart

Fase 2a (rioleringswerken na kruis) na kruis
• 11 maart: start rioleringswerken
• bouwverlof '18: afgewerkt (midden juli)

- ① Eerst stuk Koninginnelaan tussen Nieuwenlaan en Leopold II laan
- ② Dan stuk Leopold II laan tussen Koninginnelaan & Prins Albertlaan
- ③ Als laatste: Leopold II laan tussen Nieuwpoortlaan & Koninginnelaan

Fase 2b (rioleringswerken eind april)
= Koninginnelaan tussen Leopold II laan & de Astridlaan
• eind april: start rioleringswerken
• bouwverlof (20 juli - 18 augustus): rijweg onbereikbaar!
• einde werken: eind september

Fase 5
• na paasvakantie (na 23/4): start nutsleidingen + overkoppelingen startet in Prins Albertlaan & zo richting kustlaan.
HINDER: vanaf de Astridlaan zal enkel eenrichtingsverkeer mogelijk zijn richting de kustlaan
• gedurende de zomer: 2-richtingsverkeer
• start rioleringswerken: september
• einde werken: eind december

Fase 3a: obs Normandstraat + Depagebaan
• maart: afwerking nutsleidingen + overkoppelingen, rijweg toegankelijk
• begin juni: start rioleringswerken
• einde werken: eind september
Fase 3b: Kunstenaarslaan
• maart - begin april: afwerking nutsleidingen + overkoppelingen, rijweg toegankelijk
• na bouwverlof: start rioleringswerken
• einde werken: begin oktober

Fase 4
• juni: nutsleiding + overkoppelingen (t.e.m. september)
• september: rioleringswerken
• einde werken: eind december
